

**Повышение управляемости
проектной организации
с помощью линейки решений
«1С:PM Управление проектами».
Импортозамещение и примеры внедрений**



Ирина Кламбоцкая
ITLand

- ✓ **ITLand** – разработчик программного обеспечения и интегратор решений для управления заказами, проектами, ресурсами и финансами
- ✓ **Более 350** проектно-ориентированных организаций используют решения ITLand
- ✓ **ITLand** - партнер фирмы «1С» с **2004** года
- **Центр разработки** тиражных решений для **управления проектами** на платформе «1С:Предприятие 8»
- Центр **1С:ERP**
- Успешно используется СМК, соответствующая **ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**



Отрасли, в которых используется линейка решений «1С:PM Управление проектами»



НИПИ



Инжиниринг



Инвестиции



Девелопмент



Машиностроение



IT, консалтинг



Медиа



Проектный офис



«1С:PM Управление проектами КОРП»

«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP» - для ERP.УХ/Корпорации

для корпораций и холдингов



Включены в реестр
российского ПО




«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP»

для средних и крупных организаций, в т.ч. выполняющих ГОЗ



«1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой»

для малых предприятий



«1С:PM Управление проектами ПРОФ»

для МСП и проектных подразделений



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР



ЮГОРСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ



РОСАТОМ



ТЭСКО
групп

От Калининграда до Комсомольска-на-Амуре

проектно-ориентированные предприятия
повышают эффективность
и рентабельность своей деятельности
при помощи решений ITLand



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ЦКБМ
РОСАТОМ



ПЕЛЛА



ОйлГазПроект
Максимальная эффективность



НОВАТЭК
НТЦ



ПИК
ГРУППА



ИНТЕЛТЕХ



INTELTECH



РОСНЕФТЬ




ИНСТИТУТ
ГИПРОСТРОЙМОСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ






1С:Импортозамещение


Проектно-ориентированные организации:

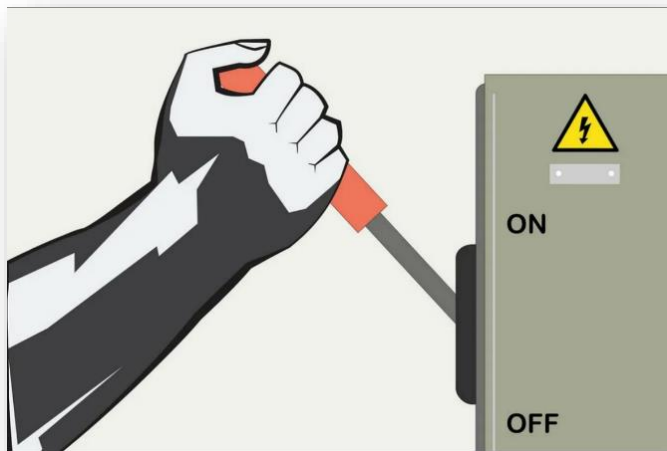

от импортозамещения
к эффективности









1C:ERP




1C:PM Управление проектами

Внедрение отечественного решения на 1С:

- Устранение риска остаться без системы на фоне ухода западных вендоров
- Переход на комплексную систему
- Ориентация на существенный ресурс специалистов по внедрению
- Снижение стоимости владения
- Вложение в развитие функциональности на надежной отечественной платформе
- Создание задела на будущее

Проблематика проектных организаций

Проекты



Ресурсы

То делать нечего, то делать некем




Производство задержало заказ



Высокий процент переделок



Влетаем в кассовый разрыв



**Деньги закончились,
нечем платить поставщикам**




**Не можем начать проект –
не хватает сотрудников**



**У нас много сотрудников,
но они ничего не успевают**



**Сотрудников надо было нанять
и обучить еще вчера**




**Отсутствие оперативной информации
о состоянии проектов**



**Каждый проект завязан
на конкретных исполнителях**



Каждый проект уникален



**Слабая связь между отделами
в рамках проектной деятельности**

Повысив управляемость с помощью наших решений, вы сможете:



Контролировать соблюдение сроков проектов и прямых расходов по контракту



Повысить денежный поток и рентабельность проектов



Получать согласованные и всегда актуальные данные по состоянию проектов



Планировать бюджет доходов и расходов (БДР) и бюджет движения денежных средств (БДДС) проектов



Организовать равномерную загрузку проектного производства



Увеличить объемы, рентабельность и выработку проектной организации





Формировать календарно-ресурсные графики: планы трудозатрат, потребности в материальных ресурсах в привязке к срокам проектов



Планировать выполняемые объемы работ



Функциональность программных продуктов линейки «1С:PM Управление проектами» по ролям

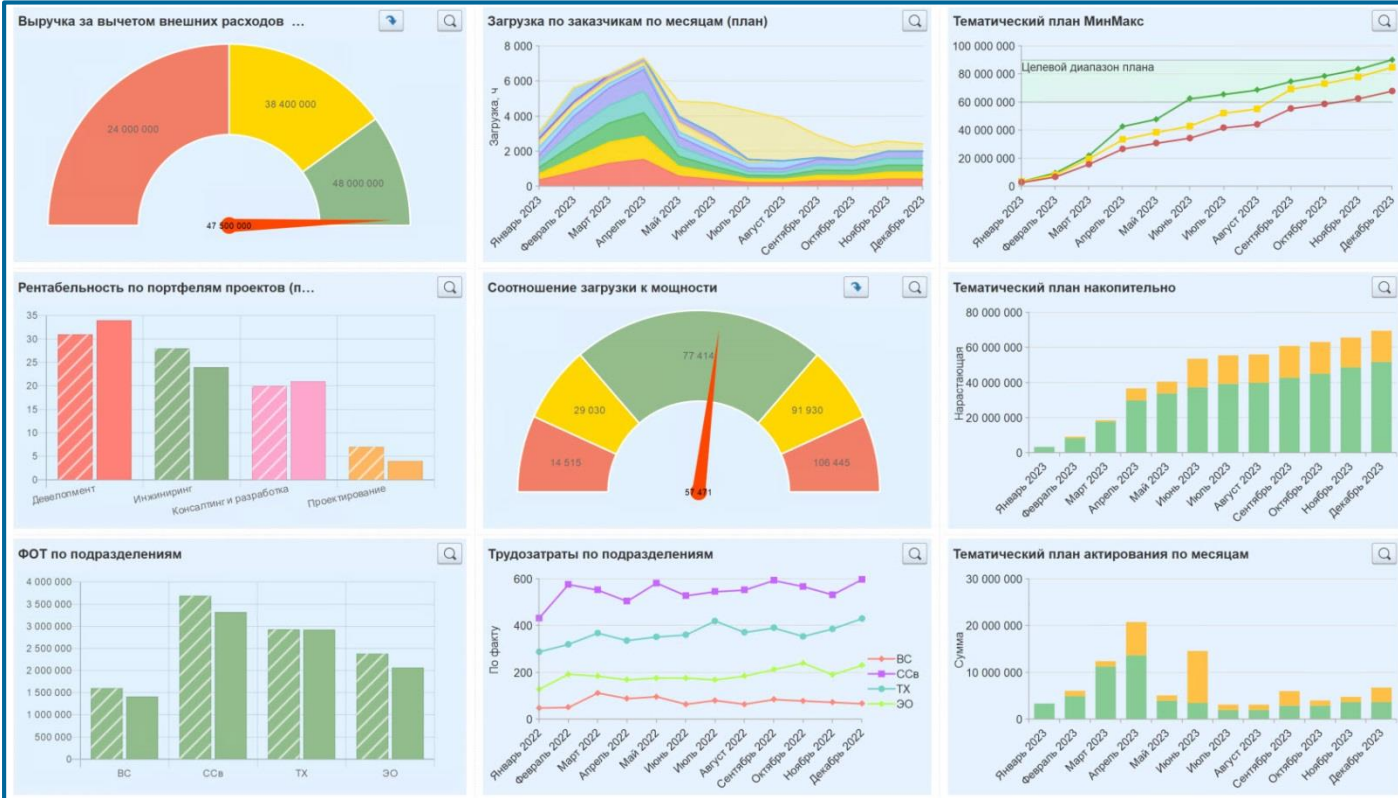

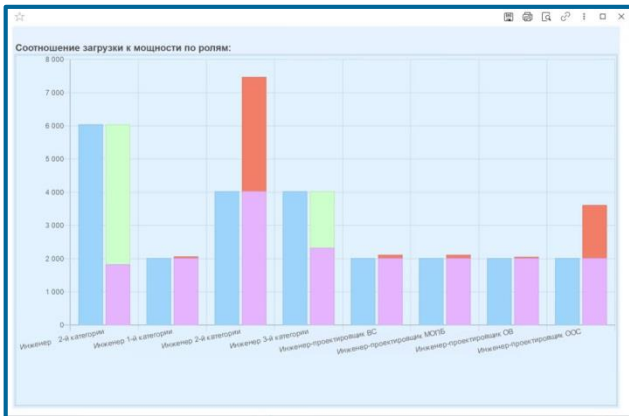


Тематический план 2022: Структура портфеля

Наименование	Код СДР	Длительность	Начало	Окончание	Роль (ФРЕНД), %	План ЕДР (доллар)	Подключенный проект	Подключенная проектная задача
Тематический план 2022	1	282.00	01.01.2022	30.12.2022	64 996.00	360 739 244.00 RUB		
01 Заемствованные	1.1	248.00	01.01.2022	26.12.2022	48 996.00	250 049 244.00 RUB		
Индикатор для АО "Альфа"	1.1.01	125.00	09.02.2022	05.08.2022	5 919.00	5 325 000.00 RUB	Индикатор для АО "Альфа"	Индикатор для АО "Альфа"
Индикатор для АО "Новый век"	1.1.02	187.00	01.04.2022	21.12.2022	3 945.00	17 210 000.00 RUB	Индикатор для АО "Новый век"	Индикатор для АО "Новый век"
Индикатор для АО "Тросвет"	1.1.03	200.00	06.01.2022	18.10.2022	7 102.00	26 950 000.00 RUB	Индикатор для АО "Тросвет"	Индикатор для АО "Тросвет"
Индикатор для ООО "Индера"	1.1.04	175.00	08.01.2022	13.09.2022	3 945.00	10 770 000.00 RUB	Индикатор для ООО "Индера"	Индикатор для ООО "Индера"
Индикатор для ООО "Надземная опора"	1.1.05	188.00	08.01.2022	30.08.2022	2 724.00	21 340 000.00 RUB	Индикатор для компании "И."	Индикатор для компании "Надземная опора"
Индикатор для ООО "Светит"	1.1.06	200.00	01.03.2022	08.12.2022	6 474.00	9 531 744.00 RUB	Индикатор для ООО "Светит"	Индикатор для ООО "Светит"
Индикатор для ООО "Т-837"	1.1.07	144.00	01.01.2022	01.08.2022	2 600.00	9 905 000.00 RUB	Проектирование Объекта Т...	Проектирование Объекта Т-837
Индикатор для ООО "Светит"	1.1.08	167.00	01.04.2022	23.11.2022	3 800.00	47 217 500.00 RUB	Разработка и строительство...	Разработка и строительство парки "Зеленое небо"
Индикатор для ООО "Светит"	1.1.09	115.00	06.01.2022	21.06.2022	5 945.00	48 450 000.00 RUB	Разработка и строительство...	Разработка и строительство парки "Зеленая равнина"
Индикатор для ООО "Светит"	1.1.10	125.00	01.04.2022	23.09.2022	4 320.00	40 850 000.00 RUB	Разработка и строительство...	Разработка и строительство парки "Зеленый путь"
Индикатор для ООО "Альфо сервис"	1.1.11	140.00	13.06.2022	26.12.2022	2 050.00	12 560 000.00 RUB	Проектирование для ООО "А."	Проектирование
02 Перспективные	1.2	130.00	01.07.2022	30.12.2022	6 000.00	110 690 000.00 RUB		
Индикатор и проектирование для ООО "Перспектива"	1.2.1	120.00	05.07.2022	20.12.2022	1 600.00	10 490 000.00 RUB		
Индикатор для ООО "Стройинженерия"	1.2.2	127.00	01.07.2022	27.12.2022	1 200.00	13 200 000.00 RUB		
Индикатор и проектирование для ООО "Перспектива"	1.2.3	130.00	01.07.2022	30.12.2022	1 600.00	45 000 000.00 RUB		
Индикатор и проектирование парки "Павел Иванович"	1.2.4	130.00	01.07.2022	30.12.2022	1 600.00	42 000 000.00 RUB		

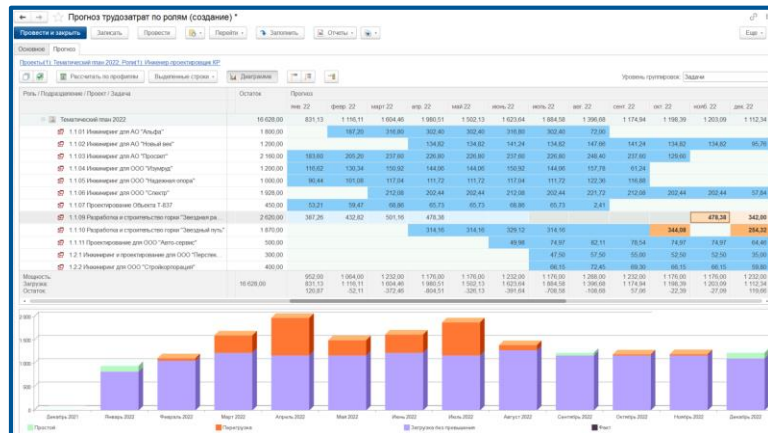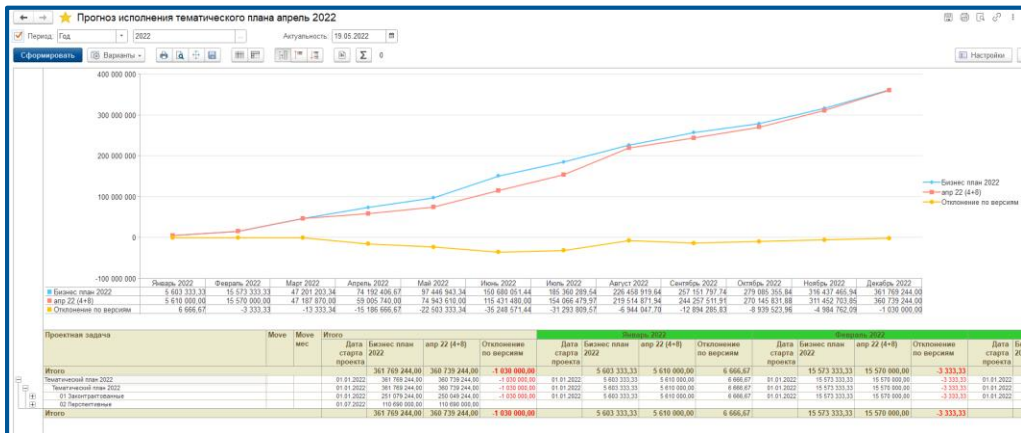

Выручка за вычетом внешних расходов ...




Рентабельность по портфелям проектов (п...




Выручка, операционная прибыль и р...




Операционная прибыль организации по месяцам

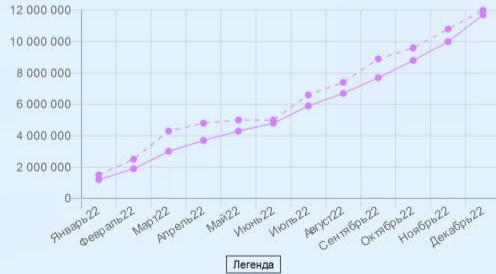

Структура стоимости по организации

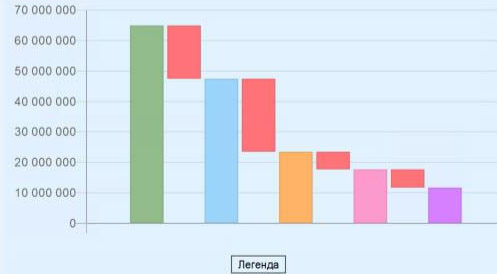

Свободный денежный поток организации



← → ☆ **Хозяйственные операции проекта**

Проект или задача: Проектирование Объекта Т-837 Не выводить непроведенные Вести дерево документов

Структура хозяйственных операций проекта

Проектная задача / Хоз. документ	Сумма	Вал...	Нач. / Отгр.	Кон. / Опл.	Готовность (%)	Состояние
[1] Проектирование Объекта Т-837			01.03.2021	22.08.2022	50	Выполняется
[1.1] Получение исходных данных			01.03.2021	01.03.2021	100	Завершена
[1.2] Этап 1 Проектная документация			01.03.2021	27.12.2021	98	Выполняется
[1.2.1] Раздел 1. Пояснительная записка			01.03.2021	12.10.2021	100	Завершена
[1.2.1.1] Регистрация доходов и расходов 000000005 от 06.12.2021 12:00:00	15 470 000,00	RUB		06.12.2021		
[1.2.1.2] Регистрация фактических движений денежных средств 000000077 от 15.01.2022 1...	15 470 000,00	RUB		15.01.2022		
[1.2.1.3] Регистрация доходов и расходов 000000002 от 31.12.2021 12:00:01	-221 000,00	RUB		31.12.2021		
[1.2.1.4] Регистрация фактически выполненного объема 000000002 от 31.10.2021 0:00:00	595 000,00	RUB		31.10.2021		
[1.2.1.5] Регистрация фактических движений денежных средств 000000002 от 28.02.202...	-221 000,00	RUB		28.02.2022		
[1.2.2] Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка			01.03.2021	17.05.2021	100	Завершена
[1.2.2.1] Регистрация доходов и расходов 000000003 от 31.12.2021 12:00:02	-455 000,00	RUB		31.12.2021		
[1.2.2.2] Регистрация фактически выполненного объема 000000003 от 31.05.2021 0:00:00	1 225 000,00	RUB		31.05.2021		
[1.2.2.3] Регистрация фактических движений денежных средств 000000030 от 28.02.202...	-455 000,00	RUB		28.02.2022		
[1.2.3] Многоквартирный жилой дом			18.05.2021	14.09.2021		
[1.2.3.1] Раздел 3. Архитектурные решения			18.05.2021	15.06.2021		
[1.2.3.1.1] Регистрация доходов и расходов 000000004 от 31.12.2021 12:00:03	-195 000,00	RUB		31.12.2021		
[1.2.3.1.2] Регистрация фактически выполненного объема 000000004 от 11.03.2022 17:...	525 000,00	RUB		11.03.2022		
[1.2.3.1.3] Регистрация фактических движений денежных средств 000000003 от 28.02.20...	-195 000,00	RUB		28.02.2022		

← → ☆ **Анализ БДР по БДС**

Период: Произвольный 01.01.2021 - 31.12.2021

Сформировать Варианты

Проект	Итого			Итого		
	ДДС(Поступления) в управленческой валюте			ДР(Доходы) в управленческой валюте		
Вид движения	Поступления, Сумма (Упр) по плану	Поступления, Сумма (Упр) по факту	Поступления, Отклонение (Упр)	Доходы, Сумма а по плану	Доходы, Сумма а по факту	Доходы, Откл онение
Итого	15 000 000,00	7 250 000,00	-7 750 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00
Строительство складского комплекса для ТД "Западный"	15 000 000,00	7 250 000,00	-7 750 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00
Строительство складского комплекса для ТД "Западный"	15 000 000,00	7 250 000,00	-7 750 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00
Строительство складского комплекса для ТД "Западный"	15 000 000,00	7 250 000,00	-7 750 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00
Проектирование объекта	5 000 000,00	4 750 000,00	-250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Доход				5 000 000,00	5 000 000,00	
Выручка за этап проекта						
Поступление		4 750 000,00	-250 000,00			
Поступление аванса за работы по этапу	5 000 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00			
Поступление оплаты работ этапа	2 500 000,00	2 250 000,00	-250 000,00			
Согласование проекта	5 000 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	5 000 000,00		-5 000 000,00
Доход				5 000 000,00		-5 000 000,00
Выручка за этап проекта				5 000 000,00		-5 000 000,00
Поступление	5 000 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00			
Поступление аванса за работы по этапу	2 500 000,00	2 500 000,00				
Поступление оплаты работ этапа	2 500 000,00		-2 500 000,00			
Строительство объекта	5 000 000,00		-5 000 000,00	5 000 000,00		-5 000 000,00
Доход				5 000 000,00		-5 000 000,00
Выручка за этап проекта				5 000 000,00		-5 000 000,00
Поступление	5 000 000,00		-5 000 000,00			
Поступление аванса за работы по этапу	2 500 000,00		-2 500 000,00			
Поступление оплаты работ этапа	2 500 000,00		-2 500 000,00			
Итого	15 000 000,00	7 250 000,00	-7 750 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00



Для директора по производству/ Для директора проектного офиса

★ Панель руководителя - Анализ показателей по портфелю проектов

Обновить Показатели

Реестр проектов Диаграмма Ганта Фазы проектов

Проект	Руководитель проекта	Статус проекта	Начало	Завершение	Просро...	Доходы (факт)	% Доходов	Маржа (факт)	% Маржа (Ф)	Поступления (факт)	% Денежного...	Расходы (факт)
Инжиниринг для АО "Альфа"	Орлов Михаил Васильевич	Выполняется	09.02.22	30.09.22	Нет	3 540 000	55,97	3 540 000,00	100,00	0	0,00	0
Инжиниринг для АО "Новый век"	Васильев Андрей Николаевич	Выполняется	01.09.22	14.09.23	Нет	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Инжиниринг для АО "Прометей"	Орлов Михаил Васильевич	Выполняется	06.01.22	18.10.22	Нет	18 300 000	67,90	18 300 000,00	100,00	0	0,00	0
Инжиниринг для компании "Надеж."	Макаров Александр Юрьевич	Выполняется	06.01.22	30.09.22	Есть	4 350 000	32,62	4 350 000,00	100,00	0	0,00	0
Инжиниринг для ООО "Изумруд"	Васильев Андрей Николаевич	Выполняется	06.01.22	09.03.23	Есть	5 620 500	49,72	4 674 570,00	83,17	230 808	22,16	945 930
Инжиниринг для ООО "Омега"	Васильев Андрей Николаевич	Выполняется	01.03.22	15.08.23	Есть	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Инжиниринг для ООО "Спектр"	Васильев Андрей Николаевич	Выполняется	01.03.22	08.12.22	Нет	5 884 920	61,74	5 884 920,00	100,00	0	0,00	0
Проектирование Автопарка	Макаров Александр Юрьевич	Выполняется	01.09.21	29.04.22	Есть	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Проектирование горн "Звездная ..."	Рыбин Николай Родионович	Запланирован	04.10.21	05.04.22	Есть	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Проектирование для ООО "Авто...	Рыбин Николай Родионович	Запланирован	01.03.22	20.06.23	Есть	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Проектирование для ООО "Строй...	Рыбин Николай Родионович	Запланирован	16.05.22	31.08.23	Нет	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Проектирование Объекта Т-837	Орлов Михаил Васильевич	Выполняется	01.03.21	22.08.22	Есть	15 470 000	60,97	8 296 420,57	53,63	15 708 000	45,27	7 173 579
Разработка и строительство горк...	Орлов Михаил Васильевич	Выполняется	01.04.22	23.11.22	Нет	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Разработка и строительство горк...	Васильев Андрей Николаевич	Выполняется	01.04.22	23.09.22	Нет	500 000	1,22	500 000,00	100,00	0	0,00	0

★ Актуализация тем. плана. Структура проекта

Назад Данные

Проект приемки: Тематический план 2022

Префикс для закрываемых объемов: 01 Закрываемые

Настройка отбора

Начало периода планирования: 01.01.2022

Тип плана/сценарий: Сценарий Июнь.22 (8+6)


Руководитель проекта: Программа проектов

Куратор проекта: Портфель проектов

Установить дополнительные отборы

Заполнить

Проектная задача	Статус	Версия	Загружать данные, Тип плана
Тематический план 2022	Выполняется		<input type="checkbox"/>
01 Закрываемые	Выполняется		<input type="checkbox"/>
Инжиниринг для АО "Альфа"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Инжиниринг для АО "Новый век"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Инжиниринг для АО "Прометей"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Инжиниринг для ООО "Изумруд"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Инжиниринг для ООО "Надежная опора"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Инжиниринг для ООО "Спектр"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Проектирование Объекта Т.837	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Разработка и строительство горн "Звездная небо"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Разработка и строительство горн "Звездная рг"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Разработка и строительство горн "Звездная рг"	Выполняется	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия
Разработка и строительство горн "Авто-сервис"	Запланирован	Сценарий Июнь.22 (8+6)	<input checked="" type="checkbox"/> Версия

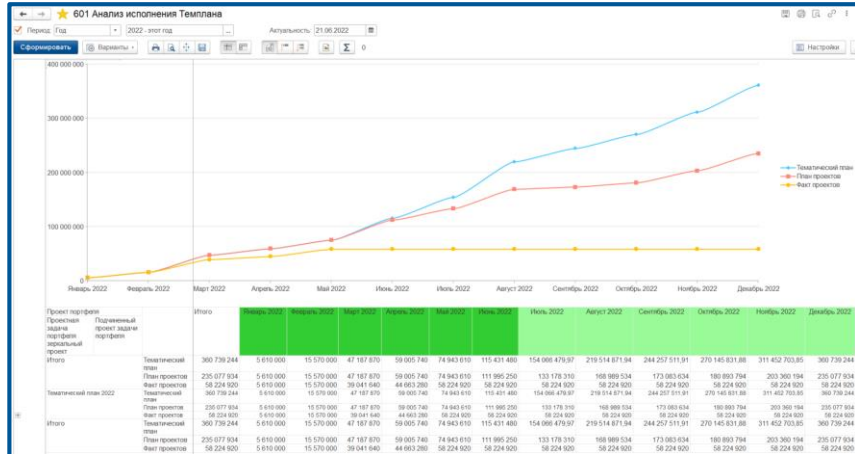


Выработка на сотрудника подразделения




Легенда

Загрузка по специальностям по подразде...

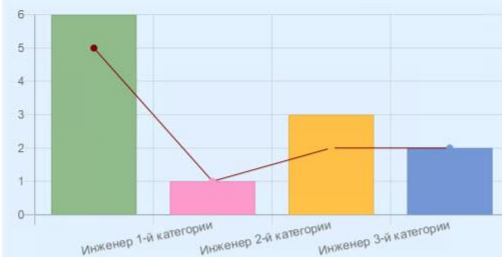


Легенда

Трудозатраты по подразделению (план-факт)

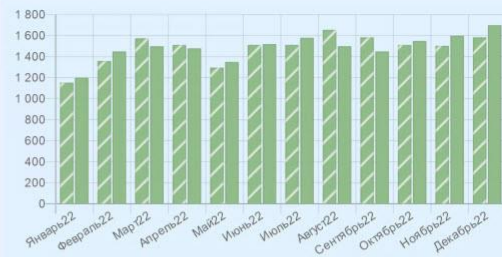

Выручка подразделения




Структура стоимости подразделения



Легенда

Свод по трудозатратам

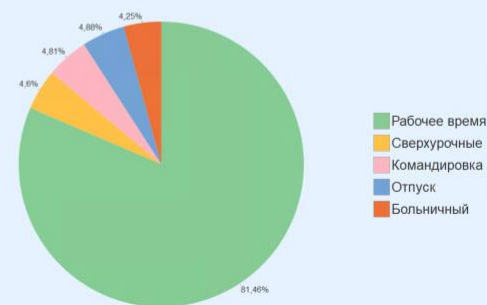

Для руководителя проектного подразделения

Панель руководителя подразделения - Планы ЭО

Область: 01.05.2021 - 30.09.2021

Подразделение Роль	Готовность задачи, %	Предв. ч. (помесячно)			Итого	Оконч. ч. (помесячно)			Итого	Отклонение (предв-факт), %	Факт, ч.	Отклонение (окопн-факт), %
		01.05.2021	01.06.2021	Итого		01.05.2021	01.06.2021	Итого				
Код СДР, Проектная задача		860,00	257,16	249,22	506,38	520,00	251,85	207,99	459,84	140,00	126,00	394,00
Итог		860,00	257,16	249,22	506,38	520,00	251,85	207,99	459,84	140,00	126,00	394,00
Инженер-проектировщик ЭО		660,00	257,16	249,22	506,38	520,00	251,85	207,99	459,84	140,00	126,00	394,00
Проектирование для эксплуатации "Надземная опора"		190,00	84,00	38,00	100,00	100,00	68,00	31,50	100,00	80,00	20,00	80,00
Проектирование для ООО "Справочник-информация"		200,00	69,83	73,26	143,19	100,00	45,36	47,52	62,88	80,00	0,00	200,00
Проектирование для ООО "Справочник-информация"		200,00	69,83	73,26	143,19	100,00	45,36	47,52	62,88	80,00	0,00	200,00
Проектирование Объекта Т-837		100,00	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.1. Проектирование Объекта Т-837		60,70	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.2. Этап 1. Проектная документация		100,00	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.2.1. Многоквартирный жилой дом		100,00	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.2.1.1. Раздел 1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических объектов (инженерно-техническая инфраструктура (сетевая инфраструктура), планы, исполнительные технические документы)		100,00	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.2.1.3.1. Раздел 5.1 Система электроснабжения		100,00	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.2.1.3.1.1. Раздел 5.1 Система электроснабжения		100,00	33,30	66,70	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	-0,00	-0,00
1.2.1.3.1.1.1. Электроосвещение внутреннее					20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-20,00	22,00	-3,00
1.2.1.3.1.2. Сетевое электрооборудование					20,00	10,00	10,00	20,00	-20,00	24,00	-4,00	-4,00
1.2.1.3.1.3. Электроосвещение внешнее					15,00	12,00	3,00	15,00	-15,00	15,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.4. Система электроснабжения					10,00	8,00	12,00	20,00	-20,00	20,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.5. Многоэтажность					10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.6. Система автоматизированного учета электроэнергии					10,00	10,00	15,00	15,00	-15,00	15,00	0,00	0,00

Анализ выполнения проектов не сформирован. Нажмите "Сформировать"

Период: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | Окончательный уровень | Прогноз трудозатрат по роли | Коэф. макс. мощност = 100 | Коэф. макс. загрузки = 100 | Показать колонки без К | Еще

Проект	ИТ	Профиль	Программа	Статус	Об	Оп
✓ Подготовка	Орлов М.	Подготовка производства	Заказчик Ретстар	Запланировано	100	100
✓ Внедрение системы	Орлов М.	Развитие и Обновление системы	Стратегическая программа	Запланировано	100	100
✓ Внедрение системы	Орлов М.	Развитие и Обновление системы	Стратегическая программа	Запланировано	100	100
✓ Внедрение системы	Орлов М.	Развитие и Обновление системы	Стратегическая программа	Запланировано	100	100
✓ Инженерия для кон.	Макаров А.	Инженерия	Заказчик компания "Надземная оп.	Запланировано	80	80
✓ Консалтинг и разрабо.	Орлов М.	Консалтинг и разработка	Заказчик АОТ "Протекс"	Запланировано	100	100
✓ Консалтинг и разрабо.	Меркушев	Консалтинг и разработка	Заказчик ЗАО "Новый век"	Запланировано	100	100
✓ Консалтинг и разрабо.	Меркушев	Консалтинг и разработка	Заказчик компания "Надземная оп."	Запланировано	100	100
✓ Консалтинг и разрабо.	Меркушев	Консалтинг и разработка	Заказчик ООО "Спектр"	Запланировано	9	9
✓ Обновление системы	Васильев	Развитие и Обновление системы	Стратегическая программа	Запланировано	100	100
✓ Подготовка проекта	Меркушев	Подготовка производства	Заказчик ЗАО "Новый век"	Запланировано	100	100
✓ Подготовка проекта	Петрова О.	Подготовка производства	Заказчик ЗАО "Новый век"	Запланировано	100	100
✓ Подготовка проекта	Петрова О.	Подготовка производства	Заказчик компания "Надземная оп."	Запланировано	100	100
✓ Подготовка проекта	Петрова О.	Подготовка производства	Заказчик ООО "Спектр"	Запланировано	100	100
✓ Проект в реализации	Васильев	Развитие и Обновление системы	Стратегическая программа	Запланировано	100	100
✓ Проектирование для	Рыбин Н.	Проектирование	Заказчик компания "Надземная оп."	Запланировано	100	100
✓ Проектирование для	Рыбин Н.	Проектирование	Заказчик ООО "Справочник-информация"	Запланировано	100	100

Проектирование Объекта Т-837. Структура проекта

Проектирование Объекта Т-837 | Старт: 01.03.2021 | Задания

Название	Связи	Длительность	Начало	Окончание	Роли (знач.) ч.	Роли (окопн.) ч.	Роли (окопн-факт.)
Проектирование Объекта Т-837		375,75	01.03.2021	22.08.2021	6 670,00	6 470,00	
Получение исходных данных			01.03.2021	01.03.2021			
Этап 1. Проектная документация	1:1	213,00	01.03.2021	27.12.2021	3 930,00	3 820,00	
Раздел 1. Проектная документация	1:1	160,00	01.03.2021	12.10.2021	170,00	170,00	Инженер-проект...
Раздел 2. Схема планировочной орга.	1:2 ИИЧ	99,00	01.03.2021	17.05.2021	350,00	350,00	Инженер-проект...
Многоквартирный жилой дом		88,00	18.05.2021	14.09.2021	1 600,00	900,00	
Раздел 3. Архитектурные решения	1:2	21,00	18.05.2021	18.04.2021	150,00	150,00	Инженер-проект...
Раздел 4. Конструктивные и общестр.	1:2 ИИЧ	22,00	18.05.2021	18.04.2021			
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании		60,00	18.05.2021	28.07.2021	350,00	350,00	
Раздел 5.1 Система электроснабжения	1:2,3 ИИЧ	30,00	18.05.2021	28.04.2021	100,00	100,00	
Электроосвещение внутреннее	1:2,3 ИИЧ	20,00	18.05.2021	14.06.2021	20,00	20,00	Инженер-проектир...
Сетевое электрооборудование	1:2,3,3.1 ИИЧ	20,00	18.05.2021	14.06.2021	20,00	20,00	Инженер-проектир...
Электроосвещение внешнее	1:2,3,3.1 ИИЧ(16)	10,00	20.05.2021	02.06.2021	15,00	15,00	Инженер-проектир...
Система электроснабжения	1:2,3,3.1 ИИЧ(32)	10,00	20.05.2021	08.06.2021	20,00	20,00	Инженер-проектир...
Многоэтажность	1:2,3,3.1.1, 1:2,3,3.1.1	10,00	15.06.2021	28.06.2021	10,00	10,00	Инженер-проектир...
Система автоматизированного учета	1:2,3,3.1.5 ИИЧ	10,00	15.06.2021	28.06.2021	15,00	15,00	Инженер-проектир...
Раздел 5.2 Система водоснабжения	1:2,3.1 ИИЧ	30,00	15.06.2021	28.07.2021	100,00	100,00	


Анализ выполнения проектов

Сформировать | Период: с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | Окончательный уровень | Прогноз трудозатрат по роли | Коэф. макс. мощност = 100 | Коэф. макс. загрузки = 100 | Еще


Роль для анализа: Проектирование (Проектировальный отдел) | Временной отрезок: с 01.01.2017 по 31.12.2017

Загрузка ресурса по периодам | Загрузка ресурса по заданиям


Перегрузка роли Т | Проставление роли Т | Загрузка Т без превышения мощност



Имя	Отменить поиск	По дням	По неделям	По месяцам	По кварталам	Еще	
N	Период	Мощность Т	Загрузка Т общ	Загрузка Т план	Загрузка Т факт	Перегрузка Т	Простой Т
1	Январь 2017 г.	144,00					
2	Февраль 2017 г.	152,00					
3	Март 2017 г.	176,00	1 468,00		1 468,00	1 232,00	
4	Апрель 2017 г.	160,00	477,94		477,94	317,94	
5	Май 2017 г.	170,00	339,06		339,06	163,06	
6	Июнь 2017 г.	168,00	203,00		203,00	35,00	
7	Июль 2017 г.	168,00	204,00		204,00	36,00	
8	Август 2017 г.	164,00	368,00		368,00	194,00	
9	Сентябрь 2017 г.	168,00	336,00		336,00	168,00	
Итого по всем		2 016,00	3 972,00		3 972,00	2 252,00	

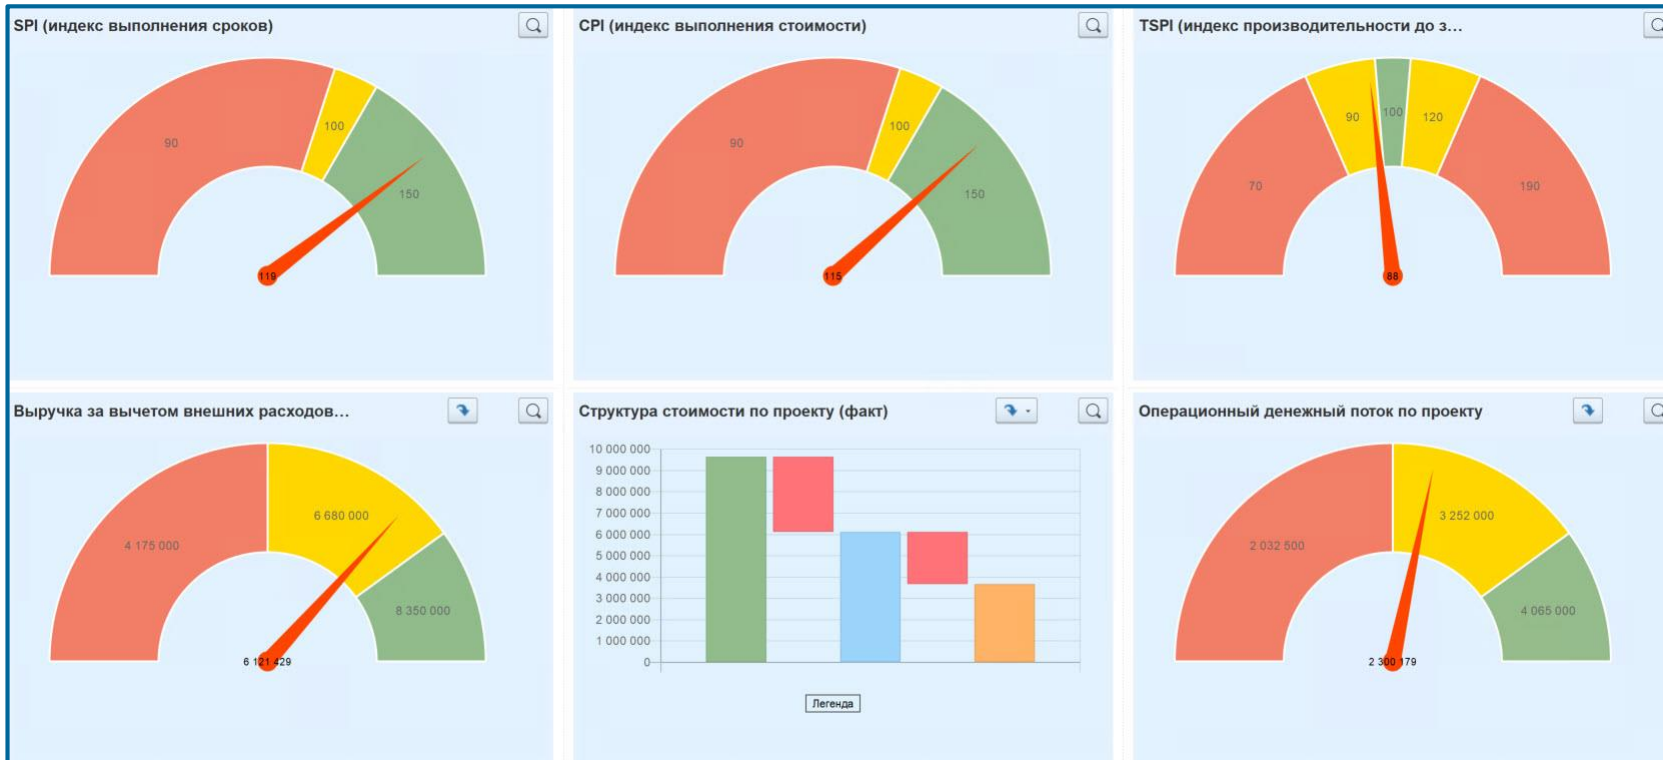


Интеграции линейки «1С:PM Управление проектами»

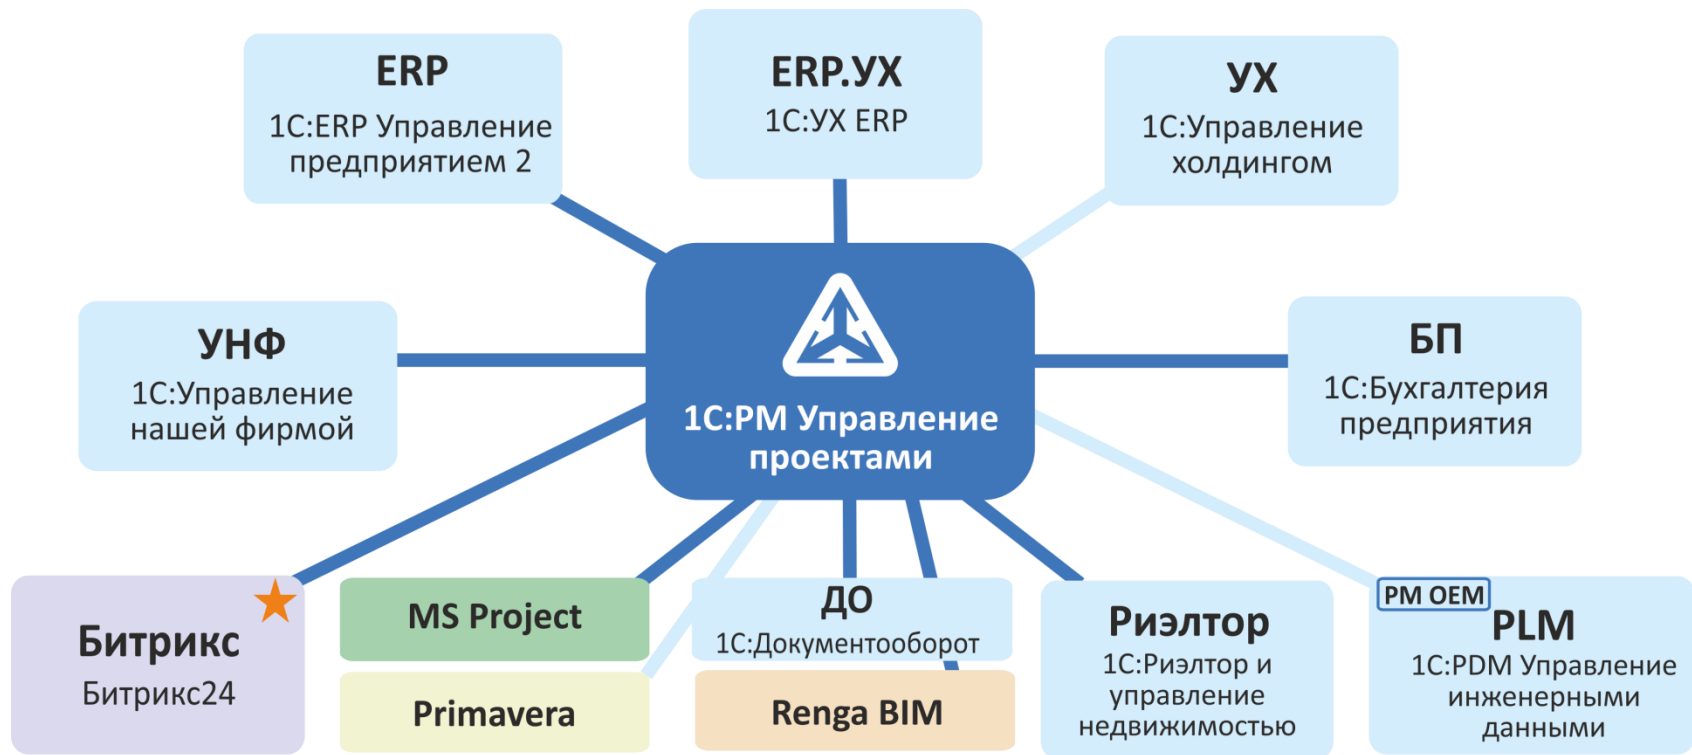

— Интеграция из коробки

— Интеграция по запросу

★ Новое

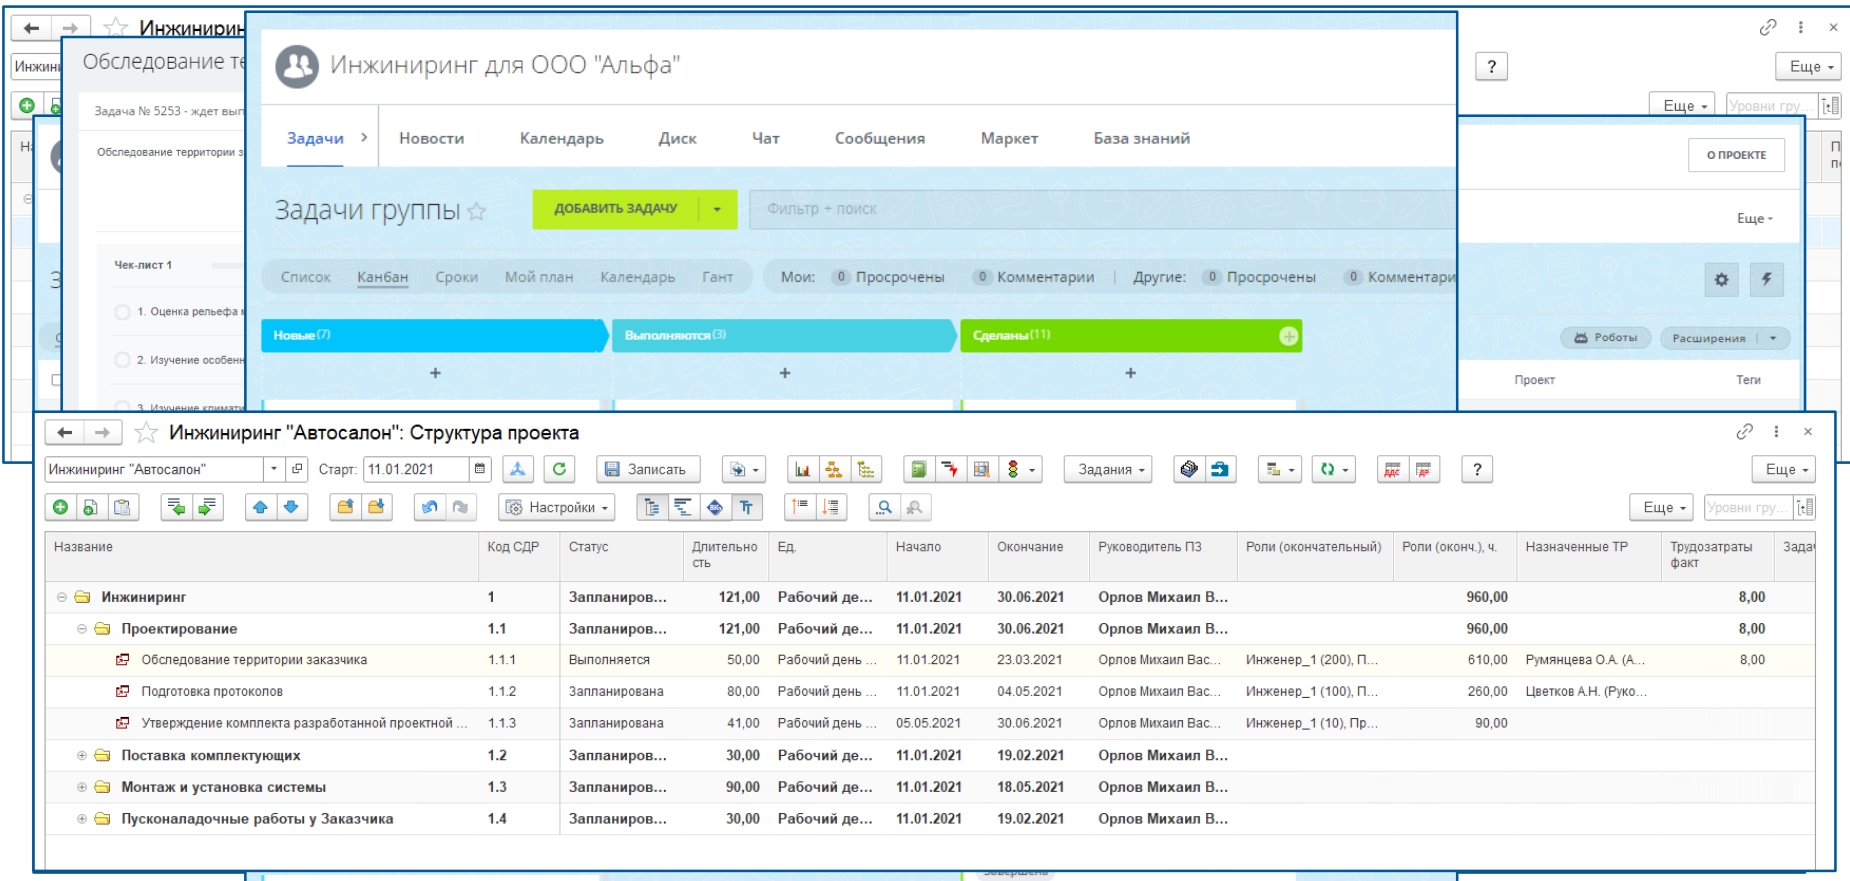

The screenshot displays the Bitrix24 interface for a project named "Инжиниринг для ООО 'Альфа'". The main view shows a task list with columns for "Новые (7)", "Выполняются (3)", and "Сделаны (11)". The interface includes navigation tabs like "Задачи", "Новости", "Календарь", "Диск", "Чат", "Сообщения", "Маркет", and "База знаний".

Below the main view, a detailed project structure is shown for "Инжиниринг 'Автосалон': Структура проекта". The structure includes a hierarchy of tasks with associated codes, statuses, durations, and costs.

Название	Код СДР	Статус	Длительность	Ед.	Начало	Окончание	Руководитель ПЗ	Роли (окончательный)	Роли (оконч.), ч.	Назначенные ТР	Трудозатраты факт	Зада
Инжиниринг	1	Запланиров...	121,00	Рабочий де...	11.01.2021	30.06.2021	Орлов Михаил В...		960,00		8,00	
Проектирование	1.1	Запланиров...	121,00	Рабочий де...	11.01.2021	30.06.2021	Орлов Михаил В...		960,00		8,00	
Обследование территории заказчика	1.1.1	Выполняется	50,00	Рабочий день ...	11.01.2021	23.03.2021	Орлов Михаил Вас...	Инженер_1 (200), П...	610,00	Румянцева О.А. (А...	8,00	
Подготовка протоколов	1.1.2	Запланирована	80,00	Рабочий день ...	11.01.2021	04.05.2021	Орлов Михаил Вас...	Инженер_1 (100), П...	260,00	Цветков А.Н. (Руко...		
Утверждение комплекта разработанной проектной ...	1.1.3	Запланирована	41,00	Рабочий день ...	05.05.2021	30.06.2021	Орлов Михаил Вас...	Инженер_1 (10), Пр...	90,00			
Поставка комплектующих	1.2	Запланиров...	30,00	Рабочий де...	11.01.2021	19.02.2021	Орлов Михаил В...					
Монтаж и установка системы	1.3	Запланиров...	90,00	Рабочий де...	11.01.2021	18.05.2021	Орлов Михаил В...					
Пусконаладочные работы у Заказчика	1.4	Запланиров...	30,00	Рабочий де...	11.01.2021	19.02.2021	Орлов Михаил В...					

★ 17-ти этажный жилой дом: BIM-плеер


Проект: 17-ти этажн | Старт: 01.03.2018 | 27.02.2019

Настройки | Нормирование


Многоэтажный жилой дом	2018			2019			2020			
	Планирование	Выполнение	Загрузка	Планирование	Выполнение	Загрузка	Планирование	Выполнение	Загрузка	
Работы ПОС	100%	[01.03.18-16.04.18]								29% [01.03.18-31.12.19]
ПОС (полный комплекс работ по организации с...	100%	[01.03.18-29.03.18]								
Временное электроснабжение	100%	[01.03.18-16.04.18]								
Устройство свайного поля	100%	[21.03.18-17.04.18]								
Срубка оголовков свай	100%	[21.03.18-17.04.18]								
Организация вывоза ж/б после срубки свай	100%	[09.04.18-16.04.18]								
Разработка котлована	100%	[21.03.18-17.04.18]								
Разработка грунта под фундаментом подвалов	100%	[21.03.18-17.04.18]								
Организация использования грунта	100%	[21.03.18-17.04.18]								
Устройство фундаментной плиты	100%	[11.04.18-17.05.18]								
Песчаная подготовка	100%	[11.04.18-16.04.18]								
Укладка геотекстиля	100%	[17.04.18-20.04.18]								
Бетонная подготовка	100%	[23.04.18-30.04.18]								
Монолитный ж/б плитный ростерк	100%	[01.05.18-08.05.18]								
Монолитная ж/б фундаментная плита	100%	[10.05.18-17.05.18]								
Монолитные железобетонные конструкци...	100%	[11.05.18-18.06.18]								
Устройство монолитных ж/б стен подвала	100%	[11.05.18-30.05.18]								
Устройство монолитных ж/б перекрытий подвала	100%	[31.05.18-18.06.18]								
Монолитные железобетонные конструкци...	54%	[11.06.18-11.04.19]								
Устройство монолитных ж/б стен этажа №1	100%	[11.06.18-29.06.18]								
Устройство монолитных ж/б перекрытий этажа №1	100%	[02.07.18-17.07.18]								
Устройство монолитных ж/б стен этажа №2	100%	[11.07.18-24.07.18]								
Устройство монолитных ж/б перекрытий этажа №2	100%	[18.07.18-31.07.18]								
Устройство монолитных ж/б стен типовых этажей	48%	[25.07.18-27.02.19]								
Устройство монолитных ж/б стен типового этажа №03	100%	[25.07.18-07.08.18]								
Устройство монолитных ж/б стен типового этажа №04	100%	[08.08.18-21.08.18]								

Шаг проекта: 10 | Вид операции: | Период: |


★ BIM Renga Viewer



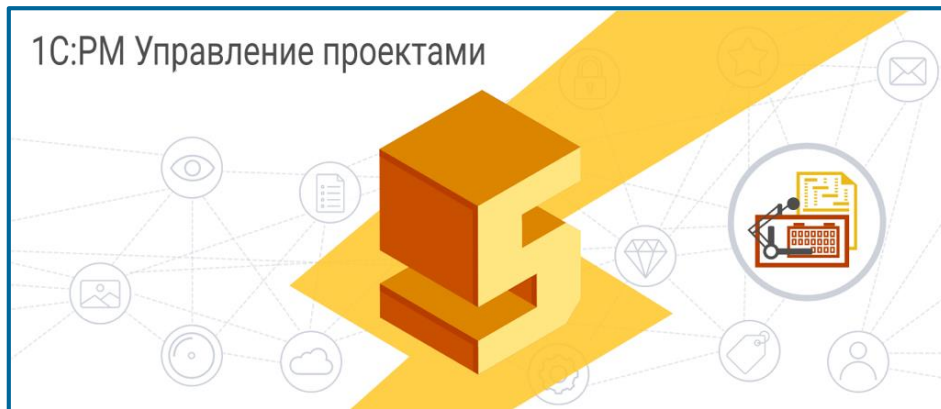

Обзор тестовой версии новой 5 редакции продукта «1С:PM Управление проектами»





← → ★ Панель руководителя
🖨️ 🔍 🔄 ⌂ ⚙️ ?
Еще -


Инжиниринг


Девелопмент


Консалтинг



Разработка


Недвижимость

Старт
Февраль 2023
Март 2023
Апрель 2023
Май 2023
Июнь 2023
Июль 2023
Август 2023
Сентябрь 2023
Октябрь 2023
Ноябрь 2023
Декабрь 2023
Январь 2024
Февраль 2024
Март 2024
Апрель 2024
Май 2024
Июнь 2024
Июль 2024
Август
Финиш

N	Элемент плана	Период задачи		Руководитель проекта	Готовность	Статус	Доходы (план)	Расходы (план)	% Маржи (план)	SPI	TSPI	2023 г.			
		Начало	Окончание									Март	Апрель	Май	
1	Панель руководителя														
2	Инжиниринг	18.01.2023	21.05.2024	Васильев А.Н	16,27	Выполняется	29 468 000,00	24 741 000,00	16	0,89	1				
3	Инжиниринг для АО "Новый век"	06.03.2023	26.01.2024	Васильев А.Н	20,00	Выполняется	8 956 000,00	6 987 000,00	21	1,06	0,99				
4	Инжиниринг для ООО "Изумруд"	18.01.2023	21.05.2024	Васильев А.Н	30,00	Выполняется	6 342 000,00	5 387 000,00	15	0,85	1,1				
5	Инжиниринг для компании "Надежна"	10.05.2023	17.04.2024	Васильев А.Н		Запланирова-	9 857 000,00	8 567 000,00	11	0,68	1,1				
6	Инжиниринг для ООО "Спектр"	20.04.2023	29.04.2024	Васильев А.Н	10,00	Выполняется	4 513 000,00	3 800 000,00	15	0,97	1,1				
7	Девелопмент	01.02.2023	29.07.2024	Макаров А.Ю.	16,92	Выполняется	113 750 001,00	86 395 346,00	24	0,88	1				
8	Строительство Гипермаркета	01.02.2023	07.03.2024	Макаров А.Ю.	20,00	Выполняется	40 500 001,00	32 248 200,00	20	0,54	1,1				
9	Строительство лаборатории для ООС	08.05.2023	29.07.2024	Макаров А.Ю.		Запланирова-	20 250 000,00	16 374 100,00	19	0,89	1,1				
10	Строительство офиса для корпорации	03.04.2023	08.09.2023	Макаров А.Ю.	40,00	Выполняется	38 000 000,00	31 748 200,00	16	0,98	1,05				
11	Строительство Ресторана	15.03.2023	05.02.2024	Макаров А.Ю.	25,00	Выполняется	15 000 000,00	6 024 846,00	59	1,1	1,1				
12	Консалтинг и разработка	18.01.2023	26.09.2023	Рыбкин Н.Р	53,79	Выполняется	22 560 500,00	17 070 600,00	26	0,72	1,15				
13	АО "Прозвет"	18.01.2023	28.03.2023	Рыбкин Н.Р	100,00	Завершена	4 456 000,00	4 456 000,00	23	0,67	1,23				
14	АО "Новый век"	18.01.2023	09.05.2023	Рыбкин Н.Р	100,00	Завершена	2 925 000,00	1 978 400,00	32	0,44	1,08				
15	"Надежная опора"	19.04.2023	26.09.2023	Рыбкин Н.Р	10,00	Выполняется	8 775 500,00	6 735 200,00	23	0,75	1,3				
16	ООО "Спектр"	28.02.2023	06.06.2023	Рыбкин Н.Р	44,16	Выполняется	5 010 000,00	3 901 000,00	22	1	1,1				
17	Создание Технического проекта	28.02.2023	01.05.2023	Рыбкин Н.Р	56,00	Выполняется	3 245 000,00	2 801 000,00	13	1	1,13				
18	Создание Бизнес модели	28.02.2023	20.03.2023	Рыбкин Н.Р	100,00	Завершена	0,00	1 567 000,00	1	1	1,06				
19	Разработка проекта	21.03.2023	01.05.2023	Рыбкин Н.Р	90,00	Выполняется	0,00	1 234 000,00	1	1	1,19				
20	Доработка ИС	02.05.2023	06.06.2023	Рыбкин Н.Р	10,00	Выполняется	1 765 000,00	1 100 000,00	37	1	1,26				

Месца
🔍
🔍
🔍

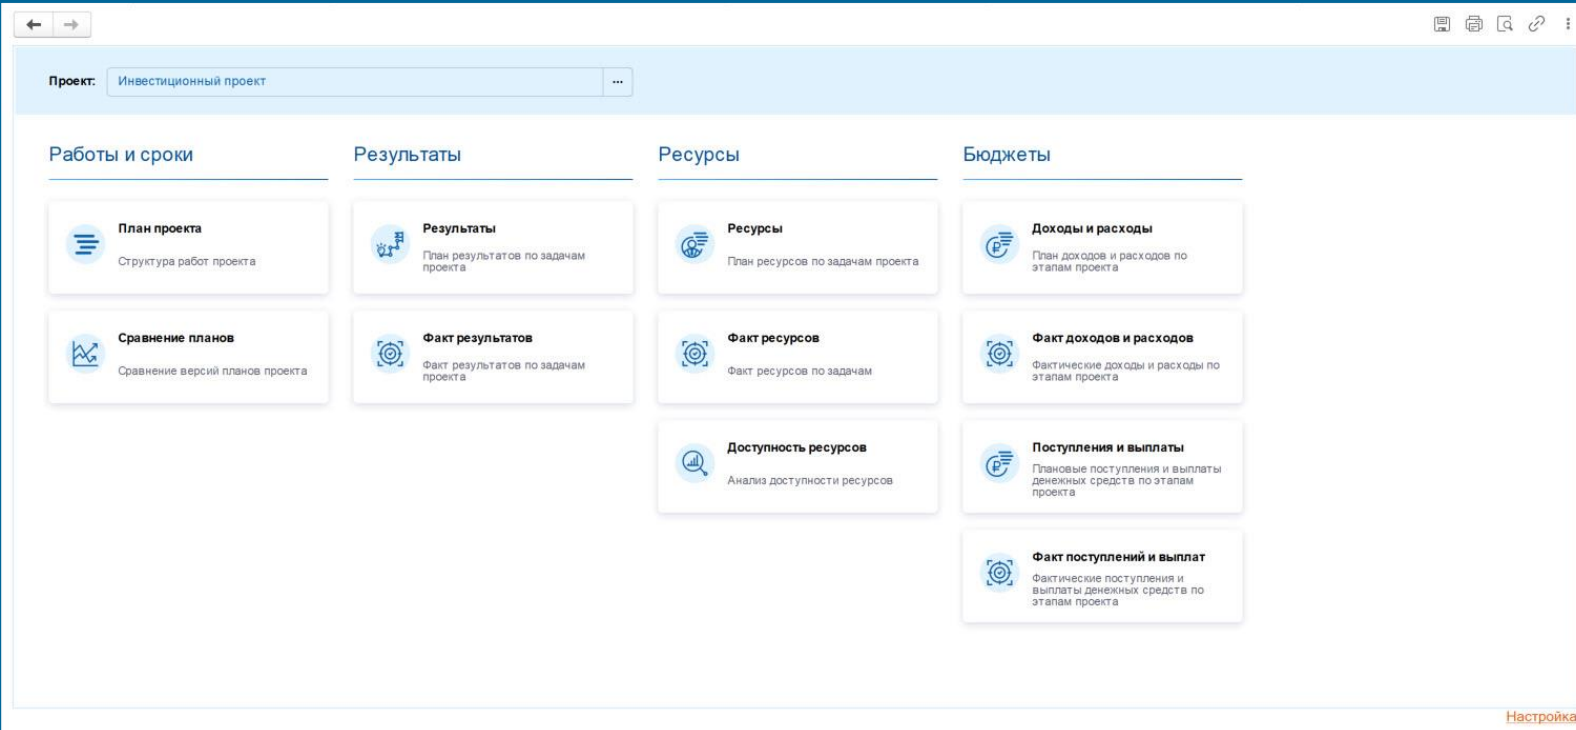

← →

Проект: Инвестиционный проект ...

Работы и сроки	Результаты	Ресурсы	Бюджеты
План проекта Структура работ проекта	Результаты План результатов по задачам проекта	Ресурсы План ресурсов по задачам проекта	Доходы и расходы План доходов и расходов по этапам проекта
Сравнение планов Сравнение версий планов проекта	Факт результатов Факт результатов по задачам проекта	Факт ресурсов Факт ресурсов по задачам	Факт доходов и расходов Фактические доходы и расходы по этапам проекта
		Доступность ресурсов Анализ доступности ресурсов	Поступления и выплаты Плановые поступления и выплаты денежных средств по этапам проекта
			Факт поступлений и выплат Фактические поступления и выплаты денежных средств по этапам проекта

Настройка

← → ☆ Инвестиционный проект: Редактор планов

Инвестиционный проект | Сценарий прогноз

Старт 023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Финиш

Ср 18.01.23 | Пт 8.08.31

N	Элемент плана	Длительность задачи		Период задачи		Экономические данные		Результаты работ и ресурсы		Годы								
		Длит.	Ед. измерения	Начало	Конец	БДР		Результаты	Ресурсы	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2030
						Доход	Расход											
1	Инвестиционный проект, Прогнозная версия																	
2	Инвестиционная фаза	869,00	Рабочий день	01.03.2023	29.06.2026	0,00	181 000,00		Проектировщик (4 352,00)									
3	Замысел проекта, маркетинг	65,00	Рабочий день	01.03.2023	30.05.2023	0,00	1 750,00		Проектировщик (520,00)									
4	Бизнес-планирование, инвестиции	88,00	Рабочий день	01.05.2023	30.08.2023	0,00	5 250,00		Проектировщик (704,00)									
5	Выделение земельного участка	108,00	Рабочий день	03.07.2023	29.11.2023	0,00	52 500,00		Проектировщик (864,00)									
6	Разработка проекта	131,00	Рабочий день	30.11.2023	30.05.2024	0,00	10 500,00		Проектировщик (1 048,00)									
7	Согласование и экспертиза проекта	64,00	Рабочий день	03.06.2024	29.08.2024	0,00	3 500,00		Проектировщик (512,00)									
8	Выбор подрядчиков и заключение контракт	88,00	Рабочий день	01.07.2024	30.10.2024	0,00	1 750,00		Проектировщик (704,00)									
9	Подготовка строительной площадки	42,00	Рабочий день	01.11.2024	30.12.2024	0,00	2 450,00		Инженер (336,00)									
10	Нулевой цикл	63,00	Рабочий день	01.01.2025	28.03.2025	0,00	13 650,00		Инженер (504,00)									
11	Надземная часть здания	196,00	Рабочий день	01.04.2025	30.12.2025	0,00	39 200,00		Инженер (1 568,00)									
12	Инженерные сети и оборудование	151,00	Рабочий день	01.09.2025	30.03.2026	0,00	12 650,00		Инженер (1 208,00)									
13	Отделочные работы	128,00	Рабочий день	03.11.2025	29.04.2026	0,00	18 900,00		Инженер (1 024,00)									
14	Наружные инженерные сети	64,00	Рабочий день	01.04.2026	29.06.2026	0,00	9 800,00		Инженер (512,00)									
15	Благоустройство территории	43,00	Рабочий день	02.03.2026	29.04.2026	0,00	3 850,00		Инженер (344,00)									
16	Сдача объектов в эксплуатацию	42,00	Рабочий день	01.05.2026	29.06.2026	0,00	3 500,00		Инженер (336,00)									
17	Заключение договоров аренды	42,00	Рабочий день	01.05.2026	29.06.2026	0,00	1 750,00		Инженер (345,00)									
18	Доходная Фаза	1 303,00	Рабочий день	01.07.2026	27.06.2031	315 000,00	0,00	Результат работ (1,00)										
19	Сдача помещений в аренду	1 303,00	Рабочий день	01.07.2026	27.06.2031	315 000,00	0,00	Результат работ (1,00)										

Скрыть | Применить | Перечитать


Предшественники | Последователи

Добавить | Перейти к предшественнику

Поиск (Ctrl+F) | Еще -

№ строки	Наименование	Тип связи	Смещение	Ед. времени смещения	Календарь связи
3	Замысел проекта, маркетинг	Окончание - Начало	-22,00	Рабочий день	

Диаграмма Ганта (Работа с большими графиками)

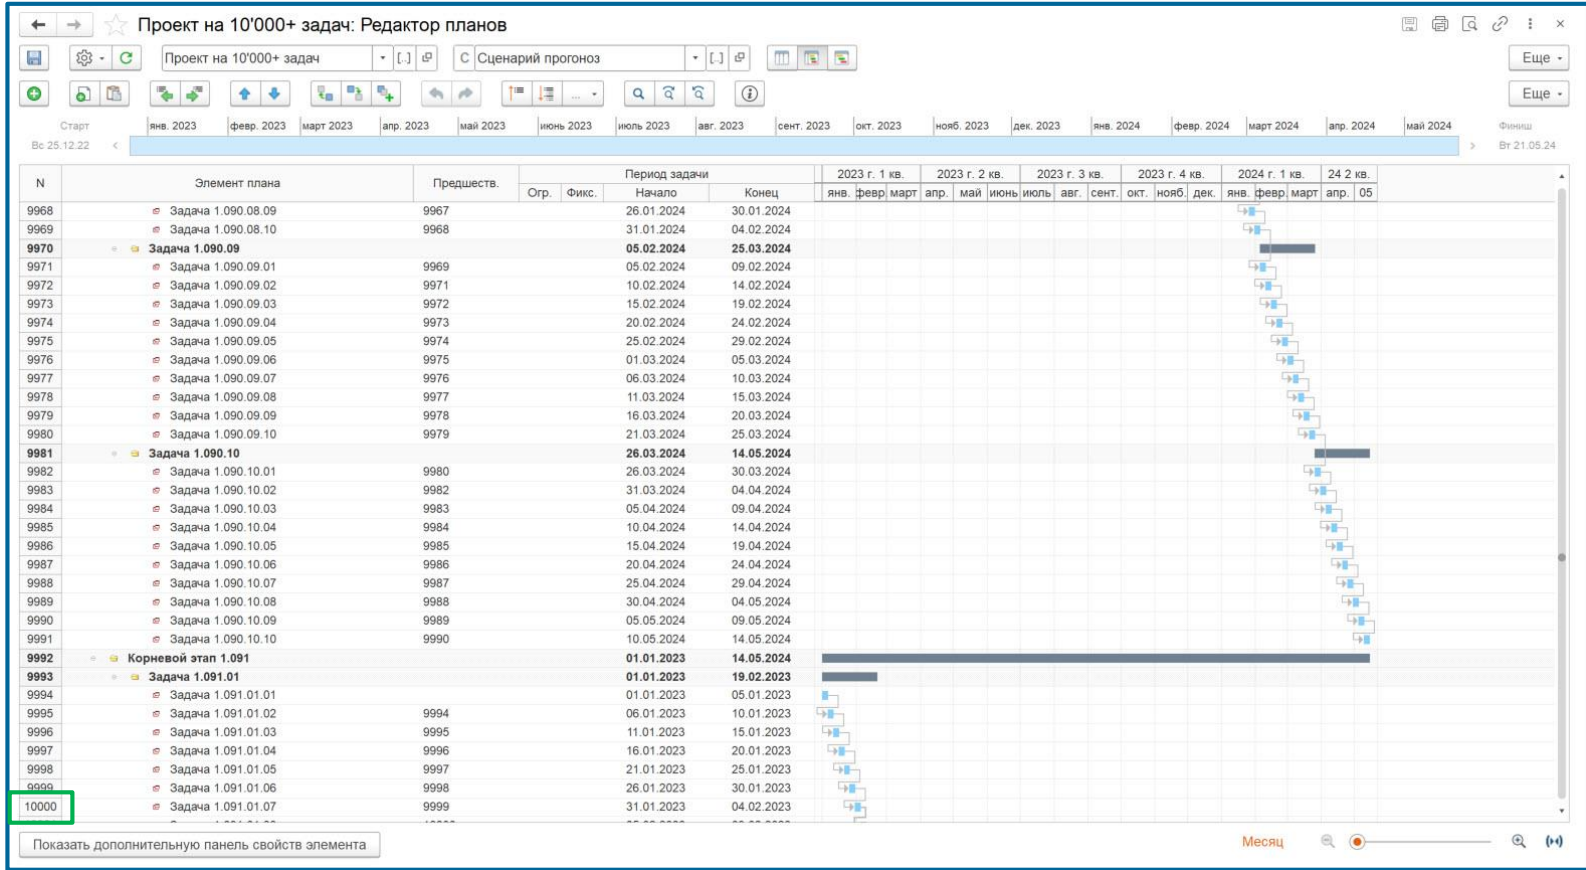

Инвестиционный проект: Редактор планов


Инвестиционный проект: Плановые доходы и расходы

Дата актуальности: 01.10.2023

Период: 01.09.2023 - 30.11.2023

N	Статья	Начало	Завершение	До периода обработки		До текущего периода		Текущий период				Накопительный итог		После периода обработки		Общий итог				
				План	Факт	План	Факт	План	Прогноз	План	Прогноз	План	Прогноз	План	Прогноз	План	Факт + Прогноз	Отклонение		
	Доходы минус расходы			-28 000,00	-28 000,00	-10 500,00	-5 000,00	-22 500,00	-22 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-12 000,00	-12 000,00	-61 000,00	-55 500,00	195 000,00	195 000,00	134 000,00	139 500,00	5 500,00
	Расходы			28 000,00	28 000,00	10 500,00	5 000,00	22 500,00	22 500,00	10 500,00	10 500,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00	55 500,00	120 000,00	120 000,00	181 000,00	175 500,00	-5 500,00
	Производственные расходы			28 000,00	28 000,00	10 500,00	5 000,00	22 500,00	22 500,00	10 500,00	10 500,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00	55 500,00	120 000,00	120 000,00	181 000,00	175 500,00	-5 500,00
	Замысел проекта, маркетинг	01.03.2023	30.05.2023	1 750,00	1 750,00									1 750,00	1 750,00			1 750,00	1 750,00	
	Бизнес-планирование, инвестиции	01.05.2023	30.08.2023	5 250,00	5 250,00									5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00	
	Выделение земельного участка	03.07.2023	29.11.2023	21 000,00	21 000,00	10 500,00	5 000,00	21 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	52 500,00	47 000,00			52 500,00	47 000,00	-5 500,00
	Разработка проекта	30.11.2023	30.05.2024					1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	10 500,00	10 500,00	
	Согласование и экспертиза проекта	03.06.2024	29.08.2024											3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Выбор подрядчиков и заключение контрактов	01.07.2024	30.10.2024											1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
	Подготовка строительной площадки	01.11.2024	30.12.2024											2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	
	Нулевой цикл	01.01.2025	28.03.2025											13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	
	Надземная часть здания	01.04.2025	30.12.2025											39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
	Инженерные сети и оборудование	01.09.2025	30.03.2026											12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	
	Отделочные работы	03.11.2025	29.04.2026											18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	
	Наружные инженерные сети	01.04.2026	29.06.2026											9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
	Благоустройство территории	02.03.2026	29.04.2026											3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	
	Сдача объектов в эксплуатацию	01.05.2026	29.06.2026											3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Заключение договоров аренды	01.05.2026	29.06.2026											1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
	Прямые (возмещаемые) расходы																			
	Общепроизводственные расходы																			
	Общехозяйственные расходы																			
	Выручка собственными силами и субподряд															315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
	Сдача помещений в аренду	01.07.2026	27.06.2031													315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	

План-Факт-Прогноз;
 Период проекта, текущий период и период обработки; разные периоды в группировках
 Редактирование в структуре проекта и табличное редактирование, комментирование



- Доступна тестовая версия для пользователей PM4 ПРОФ/КОРП
- Финал PM5 – осень 2023 года



Примеры эффективного использования линейки «1С:PM Управление проектами»



Проектирование мостов, развязок, тоннелей, эстакад, зданий, сооружений

2012

«1С:Управление проектной организацией»

2013

Управленческий учет

Бухгалтерский учет

2014

Финансовый учет

Формирование отчетов

Бюджетирование

Расчет зарплат

2015

Распределение затрат

Управление персоналом

2016

Анализ БДР и БДДС

2017

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

2018

Централизованное управление

Консолидированный расчет зарплат/

2019

информацией по портфелю

Кадровый учет



ЮГОРСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ

Проектирование промышленных и гражданских объектов

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

Работа в системе с 2016 года, 100 пользователей

Руководство
компании

Планово-
экономический отдел

Производственные
подразделения



Горнодобывающая,
металлургическая компания



**ИСУП на базе «1С:PM Управление проектами», «1С:Смета 3»,
1 184 АРМ, в системе работают 10 собственных подразделений
и управляемые общества**

Инвест. проекты в строительстве
Расчет пусковых комплексов
Сметная документация

Подготовка КСГ
Управление закрытием
выполненных СМР



ЦКБМ
РОСАТОМ

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»



«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP» Работа в системе с 2021 года, 50 рабочих мест

Планирование и контроль
выполнения проектов

Проектное бюджетирование

Расчет и анализ проектных показателей
эффективности

Управленческая отчетность



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Технологии для повышения эффективности нефтедобычи



«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
Более 700 пользователей, Работа в системе с 2016 года

Экономика
и финансы


Планирование
Мониторинг
Исполнение

Планирование
ресурсов и учет
трудозатрат

5-уровневая ролевая модель
Шаблоны проектов
Производственная программа



Архитектурное бюро
Проектирование зданий,
комплексов, ЖК



«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
Работа в системе с 2016 года, более 100 пользователей

Планирование
Управление
Анализ

Управление кадрами
Другие ресурсы

Бюджетирование
Казначейство
Учет




Проектирование
и строительство
железных дорог

«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP»

Работа в системе с 2019 года
65 лицензий

Планирование / Учет / Контроль

Данных / Сроков / Бюджетов

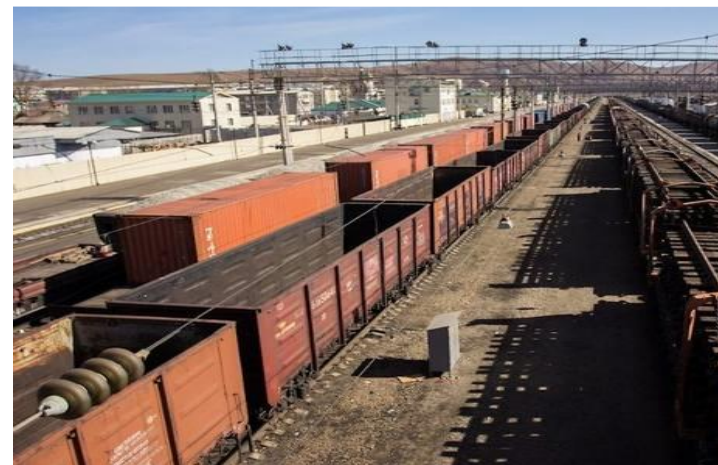



Проектно-изыскательские
работы в дорожной отрасли

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» 20 рабочих мест, работа в системе с 2022 года

- Планирование проектов
- Анализ деятельности в разрезе проектов
- Контроль загрузки исполнителей
- Контроль сроков выполнения всех работ по проекту



Строительно-монтажная организация



«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» Работа в системе с 2018 года, 10 пользователей

Управленческая информация
по всем проектам

Загрузка проектных команд

Статистика для последующего
нормирования

Контроль выполнения проектов



Проектно-изыскательская компания



«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» Работа в системе с 2022 года

- Сбор производственной программы (План, Прогноз, Факт)
- Планирование загрузки оборудования, необходимого для проведения исследований;
- Распределение трудовых ресурсов по проектам (тематикам) выполнения работ
- Планирование и активирование этапов работ;
- Планирование привлечения субподрядных организаций.



ОйлГазПроект
Максимальная эффективность

Проектно-изыскательская
компания

«1С:Управление проектной организацией» Работа с 2014 по 2019 год



«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» Работа в системе с 2022 года

Актуальная и достоверная информация по плановым данным проектов и ресурсам для исполнения

Генеральный директор
Планово-экономический отдел
Производственные отделы

Соблюдение сроков проектов и прямых расходов по контракту

Рост денежного потока и рентабельности проектов

Согласованные и всегда актуальные данные по состоянию проектов

Планирование БДР и БДДС


Равномерная загрузка проектного производства

Увеличение объемов, рентабельности и выработки проектной организации

Формирование календарно-ресурсных графиков

Планирование выполняемых объемов работ

Выдающихся Вам результатов в работе с проектами!



Ирина Кламбоцкая

(495)644-9136, (812)448-1255, info@ITLand.ru
